


Lystrup IF – Fodbold

“Aktivitet – Glæde – Fællesskab”

Projekt: Kunstgræsbane



Status pr. 18. august 2021

- Økonomien er på plads
- Aftaler med firmaer (hegn, lys, jord- og terrænarbejder) er på plads
- Myndighedernes byggetilladelse mangler og afventes
- Vores projektleder "hopper og danser" for at komme videre
- Vi regner med cirka 8 ugers arbejde fra vi får byggetilladelsen til banen er færdig

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"



Projektforløbet i nedslag:

- Udredning for valg af kunstgræsløsning – herunder belastning/tidsforbrug af brugere, samt trænings- og kamptimer
- Valg af kompetente kunstgræsleverandører
- Udarbejde fagbeskrivelse, tegninger/skitser og udbudsmateriale
- Godkendelse af projekt af Sport og Fritid Aarhus Kommune
- Licitation
- Kontraktforhandlinger med entreprenører
- Udredning af matrikler – Aarhus Kommune
- Myndighedsbehandling – herunder ændringer af projekt og VVM-redegørelser
- Tilpasning af projekt i forhold til økonomi
- Afventning på byggetilladelse
- Klar-parat-start ???

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"




Status pr. 18. august 2021

- **Hvad er det så vi får "lige om lidt"?**

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"



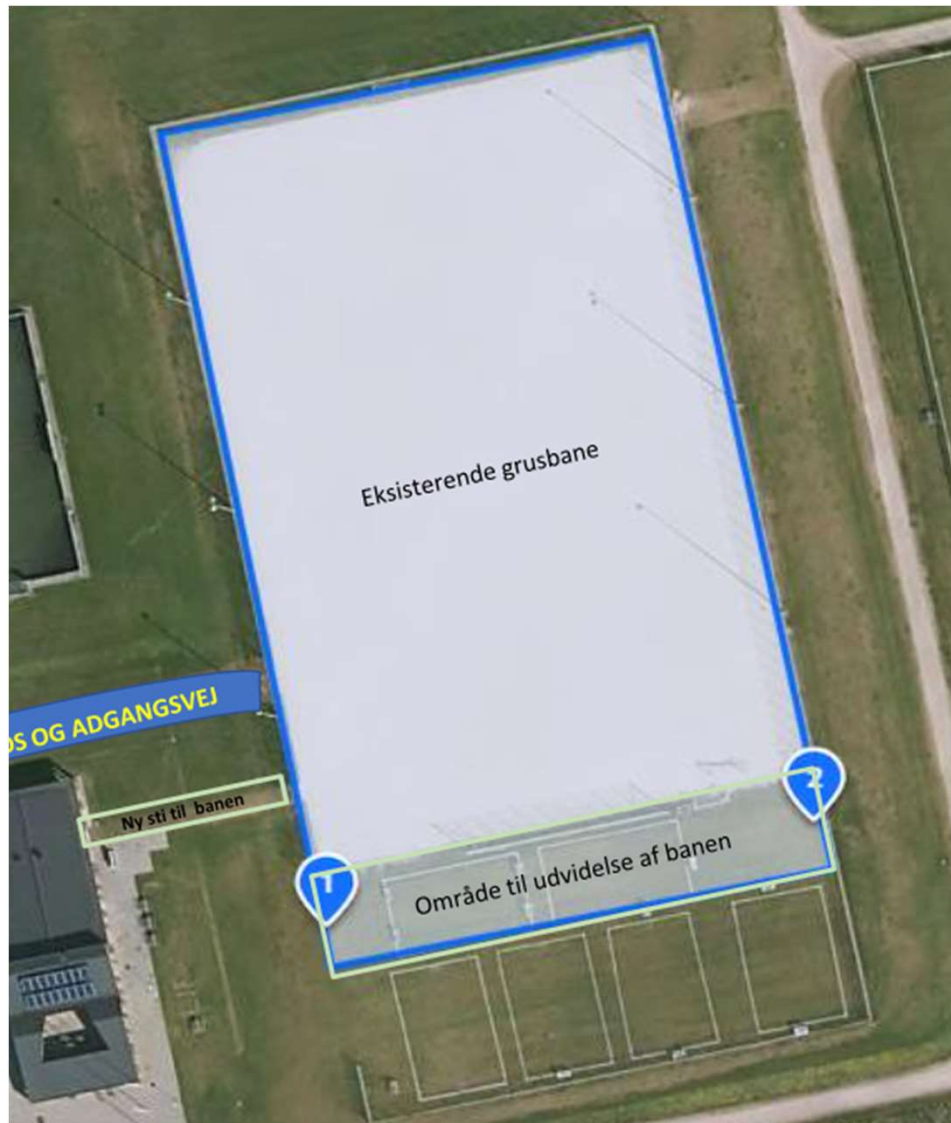

Kommunale krav betyder, at der skal være en afstand på 50 meter til naboskel. Altså må vi ikke spille på de første 10 meter af grusbanen mod Lærkehaven. Derfor rykker vi kunstgræsbanen mod syd (Elmehaven) hvor vi udnytter, at der er nogle meter at gøre godt med.

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"





Ønsket er at få så meget kunstgræsbane som muligt ovenpå grusbanen og også med en udvidelse mod Elmehaven. Men 10 meter "forsvinder" jo mod Lærkehaven på grund af krav, og enkelte meter mod Elmehaven er sparet væk. Mindre kunstgræsareal = lavere pris.

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"



PRINCIPSKITSE FOR OPBYGNING AF KUNSTGRÆSBANEN I UDVIDELSESOmrÅDET


Kunstgræstæppe - højde på strå 28 - 34 mm

Insitustøbt Shockpad - 25 mm.

Finafrettet drænstabilgrus

Eksisterende stabilgruslag

Nyt drænende stabilgruslag

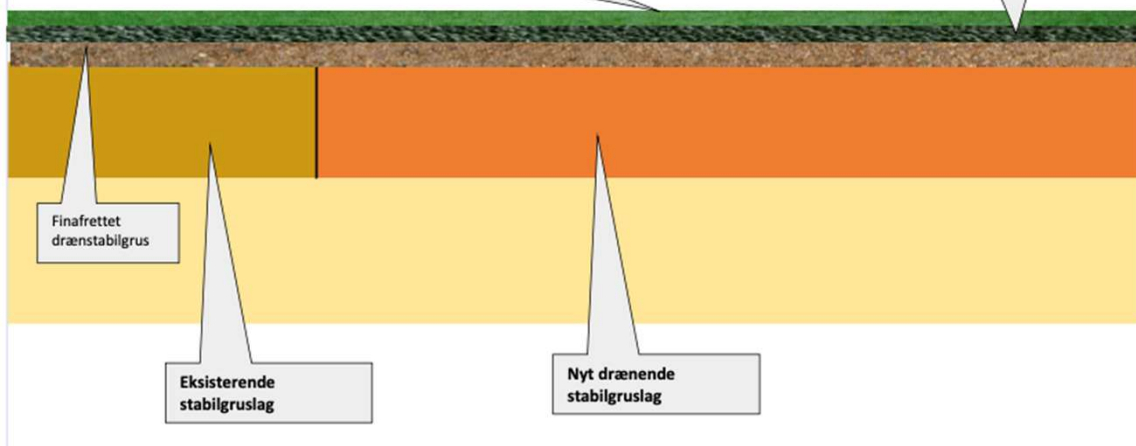

Opbygningen af kunstgræsbanen benytter det eksisterende gruslag på den nuværende grusbane (venstre del af tegningen). Og i udvidelsesområdet mod Elmehaven etableres nyt med tilsvarende opbygning (højre del af tegningen). Shockpad'en på 25 mm er ikke endeligt aftalt endnu. Der er flere muligheder i spil.

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"



Supplerende nye dræn



For at være helt sikker på et optimalt dræn af banen, tilføjer vi ekstra og nye drænrør.

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"



Hegn omkring banen



Forlængelse af
eksisterende hegn med


Det eksisterende hegn er 5 meter højt og forlænges med 13 meter i samme højde. - Skyggen af det eksisterende hegn kan ses på luftfoto.

Nyt fremtidigt hegn

Hegnet er med "lås", så klubben (bestyrelsen) kan vælge hvor åbent eller lukket anlægget skal være uden for normal træning- og kamptid.

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"




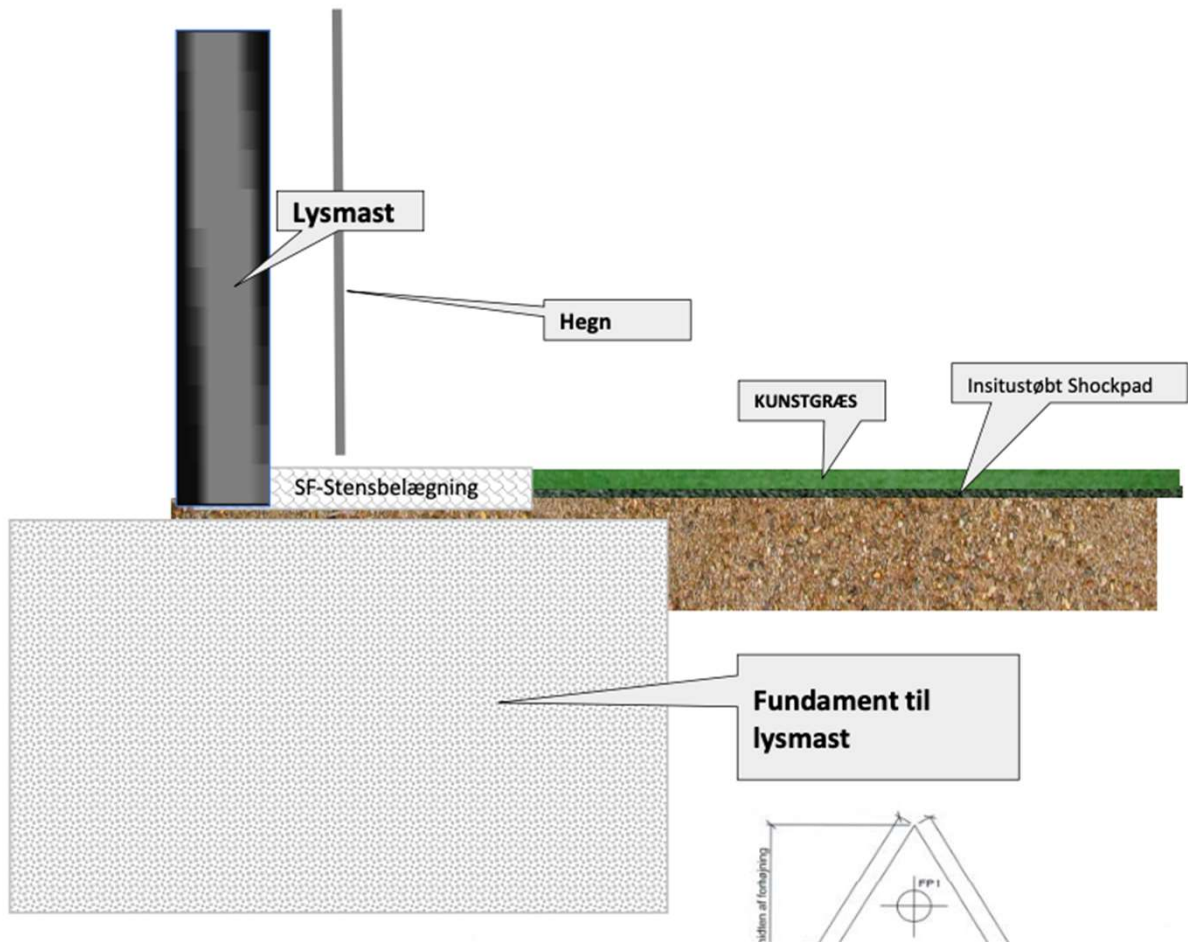

To nye lysmaster mod syd etableres for at sikre ordentlige lysforhold på den "rykkede bane".

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"



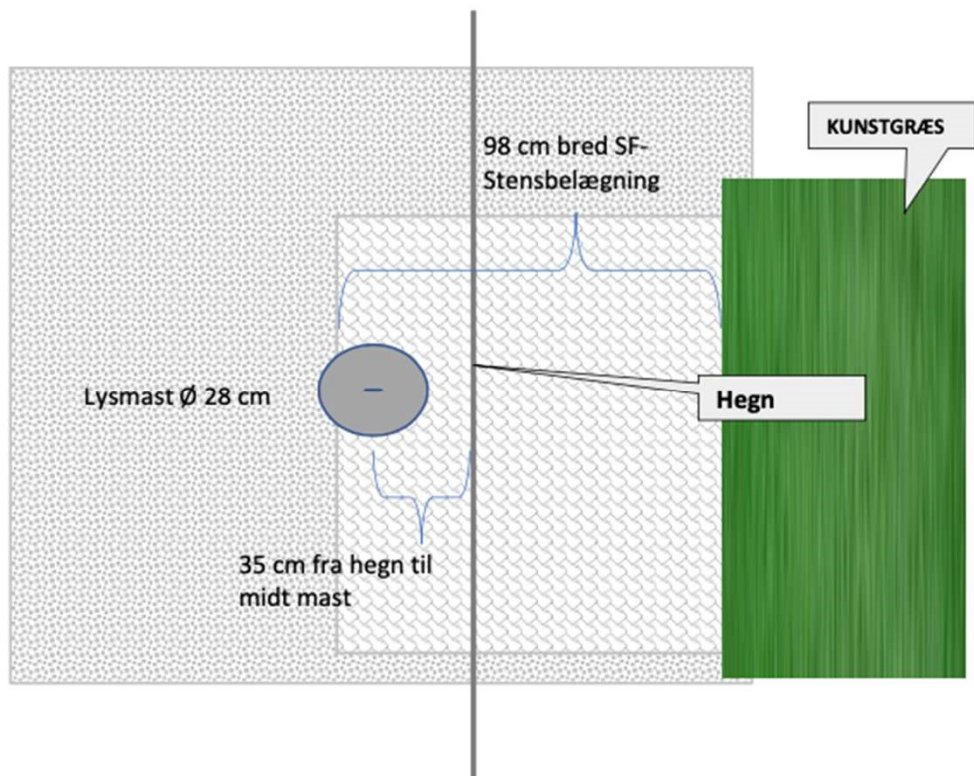

Flisebelægning (en 98 cm bred flise) rundt om hele banen med hegnet henover. Vigtigt med en god afgræsning til naturgræs, og så ser det ordentligt og pænt ud.

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"



Økonomien:

Indtægter:			
^	Tilskud fra Aarhus Kommune	2.600.000	kr.
^	Tilskud fra Aarhus Kommune - Videnspuljen	400.000	kr.
^	Nykredits Fond	200.000	kr.
*	LIF - Hovedafdelingen	100.000	kr.
*	LIFFEN	100.000	kr.
*	Juletræsfonden	100.000	kr.
*	Sponsorløb	130.049	kr.
*	Sponsorater - diverse	245.000	kr. **
*	Fodboldskolen 2020	25.000	kr.
^	Navnesponsorat	0	kr.
^	Donationer via DBU/MobilePay	30.000	kr.
*	Donationer via konto	3.299	kr.
*	On-line lotteri	4.680	kr.
^	Lions Club	25.000	kr.
*	Lystrup Sognestøtte	20.000	kr.
*	Klub-opsparing (Startsaldo)	212.619	kr.
	I alt	4.195.647	kr.

Og opgaven har så været at få udgifterne balanceret til vores indtægter.

- Ideen om at sløjfe sandbanen og lave et græsområde til 3:3 måtte opgives.
- LED lys med styrke 250 lux blev til 125 lux.
- Renovering af multibanen måtte opgives.

Lystrup IF – Fodbold
Projekt "Kunstgræsbane"



Lystrup IF – Fodbold

“Aktivitet – Glæde – Fællesskab”

